

# รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2564-2567)

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1


## สถานะของโครงการ

Strategic Objective: SO	จำนวนโครงการ		
	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	รวมทั้งหมด
SO 1 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์	9*	-	9
SO 2 สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง	4	1	5
SO 3 สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร	1	-	1
SO 4 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	1	-	1
SO 6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลง	1	2	3
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

หมายเหตุ : \* มีจำนวน 3 โครงการ ที่ไม่ส่งรายงานผลฯ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

# ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการฯ

จำนวนโครงการ

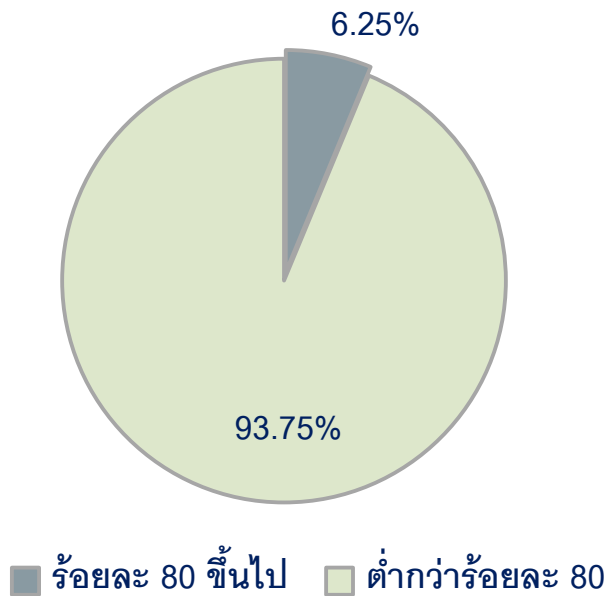


	100	80-99	60-79	40-59	20-39	0-19
SO 1 จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์	-	-	-	-	-	9
SO 2 สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง	-	-	-	-	-	4
SO 3 สร้างระบบบริการสุขภาพครบวงจร	-	-	-	-	-	1
SO 4 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	1	-	-	-	-	-
SO 6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	1	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>6.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.25</b>	<b>-</b>	<b>87.50</b>

- หมายเหตุ :
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2565 คำนวณจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 เทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2565
  - โครงการฯ ที่ไม่ส่งรายงานผลฯ จะใช้ร้อยละความสำเร็จของไตรมาสก่อนหน้า
  - ไม่นับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ 3 โครงการ


# ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการฯ (ภาพรวม)

จำนวนโครงการ

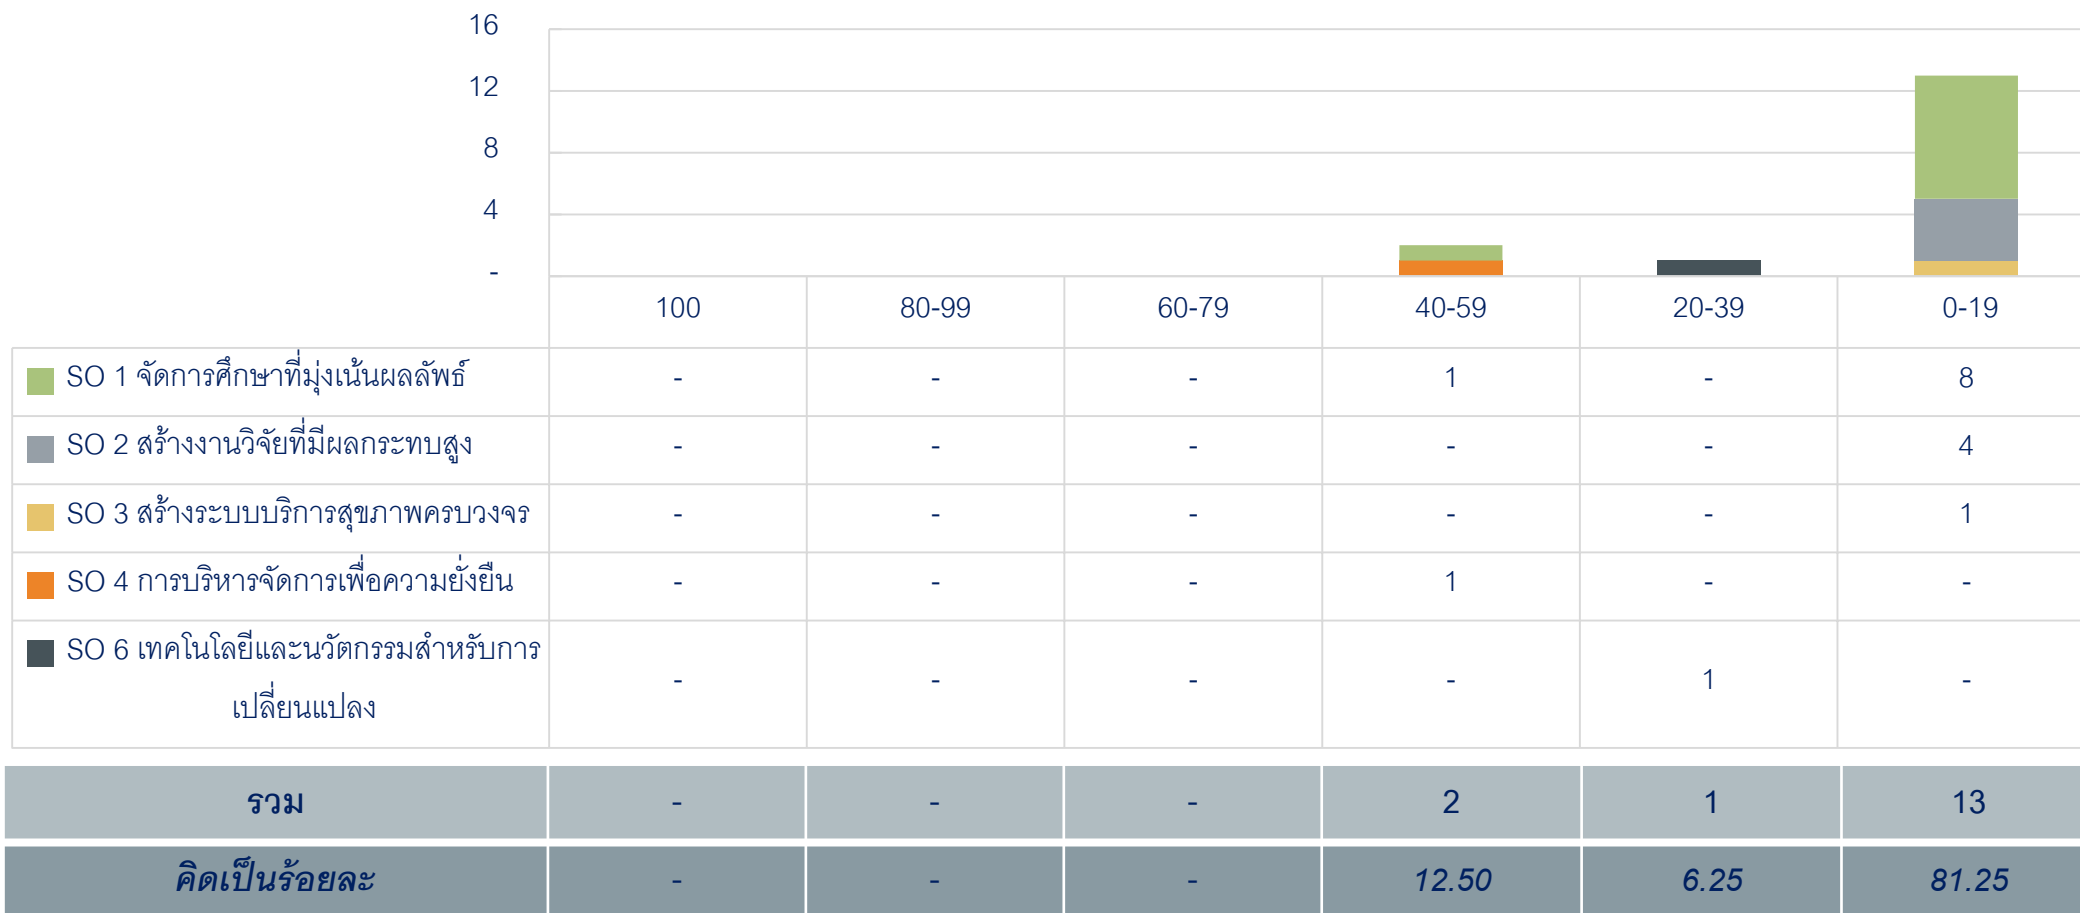


- หมายเหตุ :
- ร้อยละความสำเร็จภาพรวมของโครงการฯ คำนวณจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2564 เทียบกับเป้าหมายภาพรวมของโครงการฯ
  - โครงการฯ ที่ไม่ส่งรายงานผล จะใช้ร้อยละความสำเร็จของไตรมาสก่อนหน้า
  - ไม่นับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ 3 โครงการ

# การเบิกจ่ายงบประมาณ

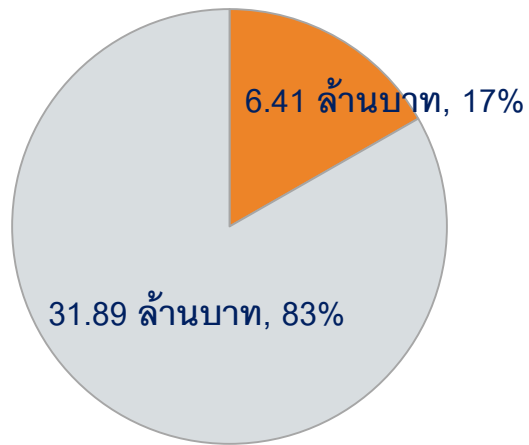

■ งบประมาณใช้จริง    □ งบประมาณคงเหลือ

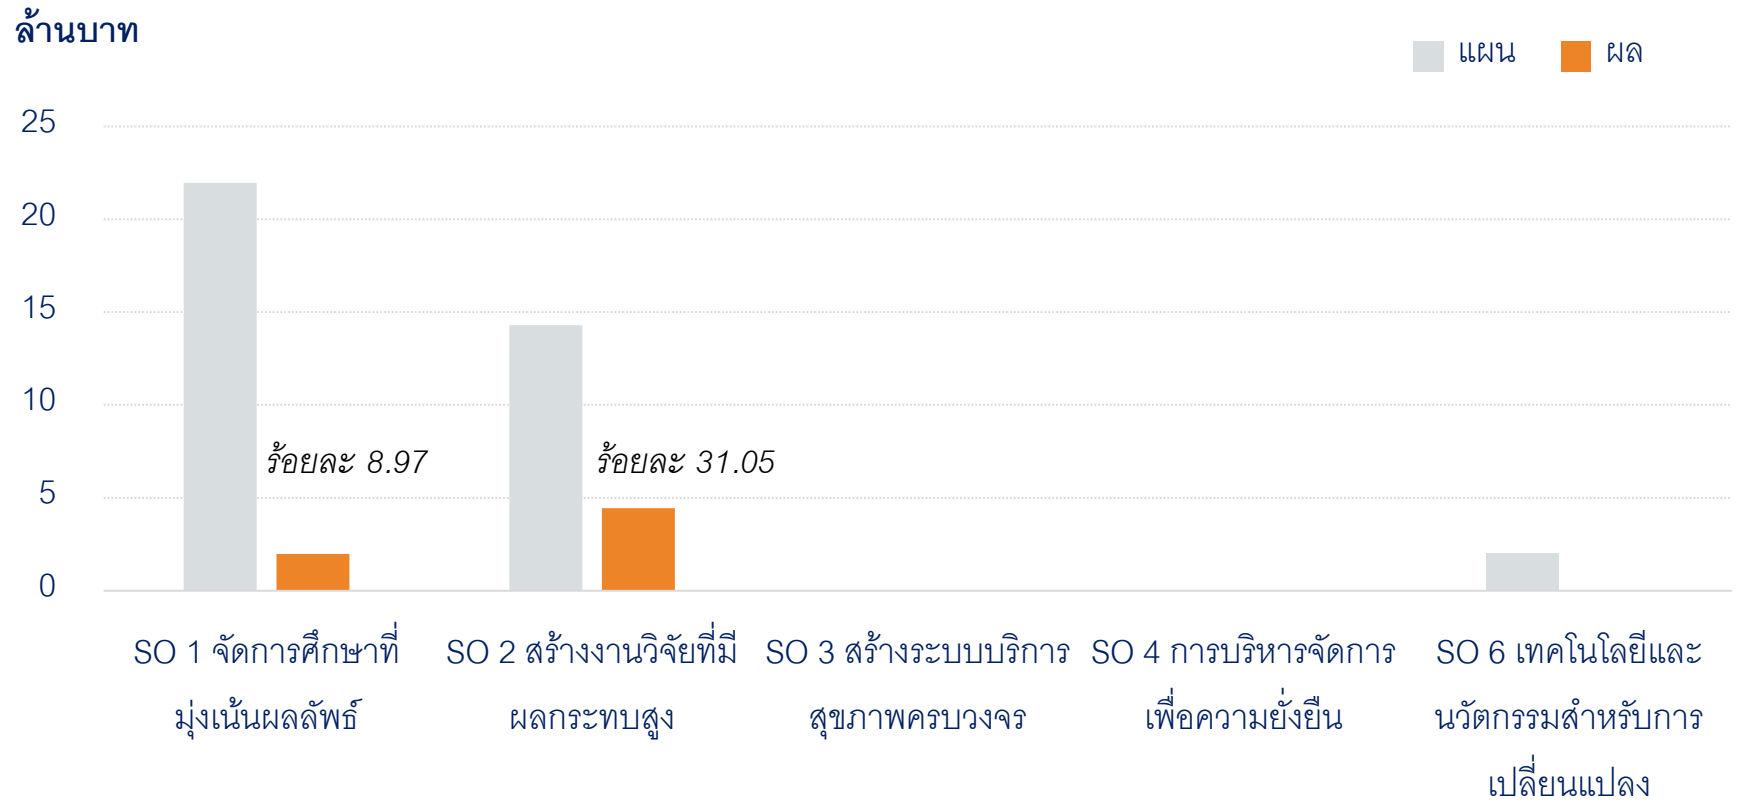

หมายเหตุ : - SO 2 โครงการศูนย์เครื่องพิมพ์สามมิติฯ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ เนื่องจาก ในโครงการมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 แต่ขออนุมัติและจัดซื้อจริง ในปีงบประมาณ 2565  
 - SO 3 และ SO 4 เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

# ปัญหาอุปสรรค

## การระบาดของ COVID-19

1. ทำให้ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้ หรือหยุดดำเนินการในบางกิจกรรม เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมแบบ Onsite
2. ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ อาทิเช่น ในส่วนของการอบรม, การหาตารางงานของผู้เกี่ยวข้องให้ตรงกัน, ส่งผลกระทบงานวิจัยที่ต้องทำใน labs/case
3. การจัดกิจกรรมในรูปแบบ on-site ยังคงทำได้ไม่เต็มรูปแบบ และในบางกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นออนไลน์

## ด้านสารสนเทศ

1. ระบบสนับสนุนในส่วนของผู้ใช้, โปรแกรม SLCM และ e-portfolio application
2. ปัญหาการส่ง Portfolio ผ่าน Moodle ซึ่งระบบไม่สามารถดึงข้อมูล Portfolio ออกมาเป็นชั้นปีได้ ต้องทำการ Download ทีละฉบับ ซึ่งมีจำนวนมาก

# สิ่งที่ต้องการให้คณะฯ สนับสนุน

## ด้านบุคลากร

1. สนับสนุนนักวิชาการไอทีทัศนศึกษาหรือนักวิชาการสารสนเทศ สำหรับการดูแลและการ maintenance ระบบ application การประสานงานกับผู้ดูแล E-portfolio

## ด้านสารสนเทศ

1. ต้องการให้พัฒนาระบบ Moodle ของคณะฯ เพื่อให้สามารถรองรับการจัดเก็บ และ Download Portfolio จำนวนมากได้
